

MAB131

TWOJA KONFIGURACJA:

FINISH

MABUDO START

1 Fundamenty	Roboty ziemne (bez ewentualnej wymiany gruntu), ziemia z wykopu pozostanie na placu budowy lub w jego pobliżu. Ułożenie zbrojenia oraz betonowanie ław fundamentowych, ułożenie prefabrykowanych żelbetonowych belek podwalinowych obwodowych o wymiarach 15x105 cm, obsypanie i zagęszczenie fundamentów, ułożenie warstwy chudziaka gr. 10 cm. Wykonanie instalacji uziomu.
2 Ściany	Montaż prefabrykowanych ścian zewnętrznych ECO350 o współczynniku przenikania ciepła $U=0,147$ W/m ² K (warstwa elewacyjna gr. 10 cm z gotową fakturą zewnętrzną, warstwa izolacji termicznej ze styropianu grafitowego od wewnątrz budynku wraz z drewnianym rusztem do mocowania płyt g-k).
3 Elementy dodatkowe	Prefabrykowane stalowe podciąg i słupki zabezpieczone antykorozyjnie
4 Wiązba	Montaż prefabrykowanej więźby dachowej w postaci wiązarów kratownicowych wykonanych ze szwedzkiego drewna konstrukcyjnego, czterostronnie struganego, klasy C24, łączonych na płytki kolczaste firmy MITEK. Pasy dolne wiązarów wraz z dodatkowymi belkami podłogowymi stanowią konstrukcję poddasza użytkowego oraz

MABUDO PLUS

5 Pokrycie dachu	Pokrycie dachu dachówką cementową celtycką lumino „Braas” kolor standard wraz z kominkami wentylacyjnymi, łaty, kontrłaty, folia, obróbki blacharskie, rynny i spusty PCV „Marley”.
6 Podbitki	Nie dotyczy.
7 Elementy dodatkowe	Okna połaciowe, pakiet 3 szyb - 6 szt. Ułożenie na belkach drewnianych stropu jednej warstwy płyty OSB o gr. 22 mm.
8 Stolarka okienna	Stolarka okienna PCV, pakiet 3 szyb, kolor struktura standard obustronny do wyboru (gładki: biały, antracyt, szaro-czarny), ciepły montaż, parapety stalowe. Parapety nie są montowane w oknach typu balkonowego oraz HS.
9 Stolarka drzwiowa	Drzwi zewnętrzne WIKĘD Premium 54mm z ościeżnicą aluminiową Termo, wzór 26, bez przeszklenia, klamka Prime, Tahoma, Manitoba lub Magnus (do wyboru) w kolorze Inox, wkładka + wkładko gałka, kolor antracyt, skrzydło "90". Dodatkowa wkładka wraz z kompletem kluczy.
10 Brama garażowa	Nie dotyczy.
11 Schody	Schody wewnętrzne o konstrukcji stalowo – drewnianej zabezpieczone antykorozyjnie (stopnie tymczasowe).
12 Elewacja	Malowanie elewacji farbą silikonową (kolor do uzgodnienia).
13 Komin	Nie dotyczy.
14 Rolety	Nie dotyczy.

MABUDO FINISH

PRACE WYKOŃCZENIOWE


15 Podłoga na gruncie	Wylewka betonowa wzmocniona włóknami polimerowymi gr. 6cm, styropian EPS 100 $\lambda \leq 0,038$ [W/mK] gr. 2x10cm, folia polietylenowa 0,5mm.	
16 Sufit podwieszany nad parterem	Wypełnienie konstrukcji stropu wełną mineralną gr. 20cm $\lambda=0,035$ [W/mK], folia PE 0,2mm. Sufity na ruszcie metalowym, płyty GKB gr.1,25cm, w pomieszczeniach z zwiększoną wilgotnością płyta GKBI gr. 1,25cm, wykończenie spoin Q2 (szpachlowanie spoin płyt gipsowo-kartonowych oraz widocznych części elementów mocujących i wykończeniowych (wkręty)).	
17 Ściany działowe, instalacyjne, okładziny ściennie	Ściany działowe w konstrukcji lekkiej ze stalowych kształtowników zimnogiętych CW100/125 płyta GKB gr. 1,25cm, w pomieszczeniach z zwiększoną wilgotnością płyta	¹ GK
18 Podłoga na piętrze	Ułożenie folii budowlanej, styropianu gr. 5 cm oraz szlichty betonowej zbrojonej włóknem rozproszonym gr. 5 cm.	
19 Sufit podwieszany na poddaszu	Wypełnienie konstrukcji dachu wełną mineralną gr. 20 cm + 5 cm $\lambda=0,035$ [W/mK], folia PE 0,2mm. Sufity na ruszcie metalowym, płyty GKB gr.1,25cm, w pomieszczenia z	
20 Pozostałe	Nie dotyczy.	

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

21	Instalacja co oraz ców	Instalacja centralnego ogrzewania niskotemperaturowego, płaszczyznowego (podłogowego) w rurach tworzywowych wielowarstwowych. Powietrzna pompa ciepła	
22	Instalacja Wod-Kan	Montaż kanalizacji podposadzkowej.	
23	Wentylacja mechaniczna	Liczba podejść wod-kan.: System wentylacji z centralą nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła zlokalizowaną w pomieszczeniu gospodarczym. Kanały wentylacyjne elastyczne. Centrala	10
24	Instalacje elektryczne	Instalacja odgromowa. Tablica mieszkaniowa. Ilość punktów oświetleniowych wewnętrznych: Ilość punktów elektrycznych (włącznik, gniazda, itd.): Punkty oświetleniowe zewnętrzne: Tablica teletechniczna. Ilość punktów teletechnicznych (RJ45, TV, Sat itd.): Montaż panelu wideodomofonu.	45 65 1 12

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

MABUDO FINISH

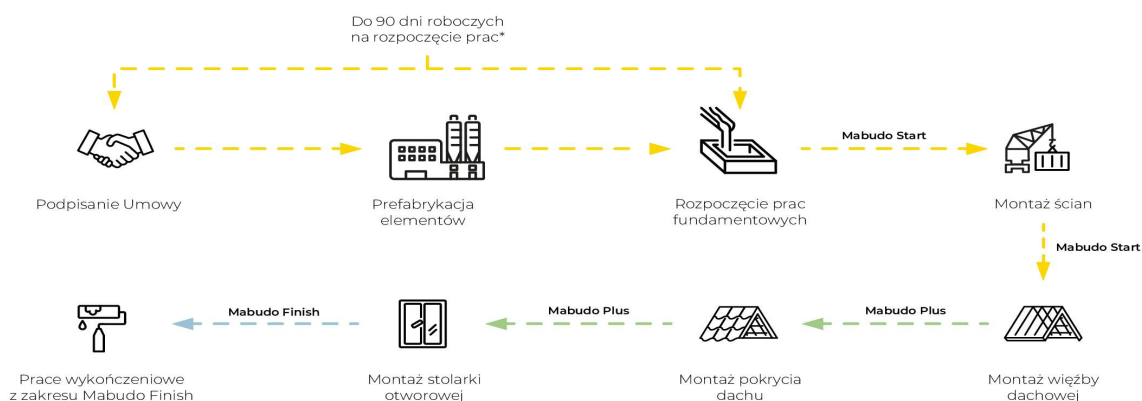

Mabudo Finish to zakres prac w skład których wchodzi m. in.:

- Montaż ścian działowych
- Instalacje wod-kan
- Instalacje CO z pompą ciepła
- Instalacje wentylacyjne z rekuperatorem
- Wewnętrzne instalacje elektryczne
- Wylewki
- Ocieplenie połaci dachu w przypadku poddasza użytkowego
- Ocieplenie stropów

Od momentu podpisania protokołu odbioru prac **Mabudo Plus**, prace trwają do **80 dni** roboczych.

MABUDO

www.mabudo.com, domy@mabudo.pl
